

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Viernes 18 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	14 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — conformación, densificación y liberación de la Capa 12; continuidad al suministro de la capa siguiente		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Concluido	Concluido	Liberada	En proceso
Conformación Capa 12 (tractor D5)	Densificación (pata de cabra)	Capa 12 — espesor 0.50 m verificado	Conformación de capa siguiente

3. Descripción de actividades

Durante la jornada se continuó con el suministro de material para la conformación de la capa número 12. El material fue extendido, distribuido y bandeado mediante tractor sobre orugas D5, procurando mantener una superficie uniforme y evitar la segregación de las partículas.

Posteriormente, se ejecutó la densificación con vibrocompactador tipo pata de cabra, aplicando el procedimiento constructivo definido mediante la plataforma de prueba. Una vez concluidos los ciclos establecidos, la capa quedó liberada por proceso constructivo.


Como parte del control topográfico, se tomaron elevaciones para verificar los niveles y comprobar que la capa terminada cumpliera con el espesor compactado de 0.50 m. Finalizada la verificación de la capa 12, se dio continuidad al suministro y conformación de la capa siguiente.

Estado de actividades


Actividad	Estado
Suministro, extendido y bandedo — Capa 12 (tractor D5)	Concluido
Densificación (vibrocompactador pata de cabra)	Concluido
Control topográfico — verificación de espesor compactado (0.50 m)	Concluido
Capa 12 — liberación por proceso constructivo	Liberada
Suministro y conformación de la capa siguiente	En proceso

El detalle del control topográfico de la capa 12 se documenta en el archivo de campo correspondiente.

4. Registro fotográfico

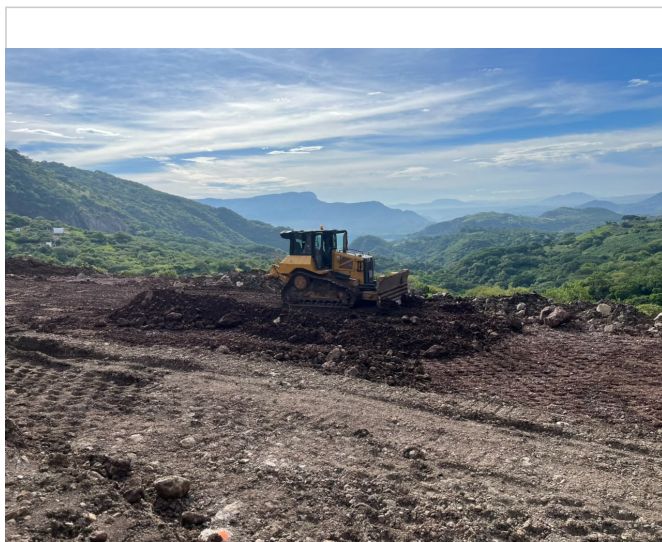

Conformación de capa con tractor sobre orugas D5

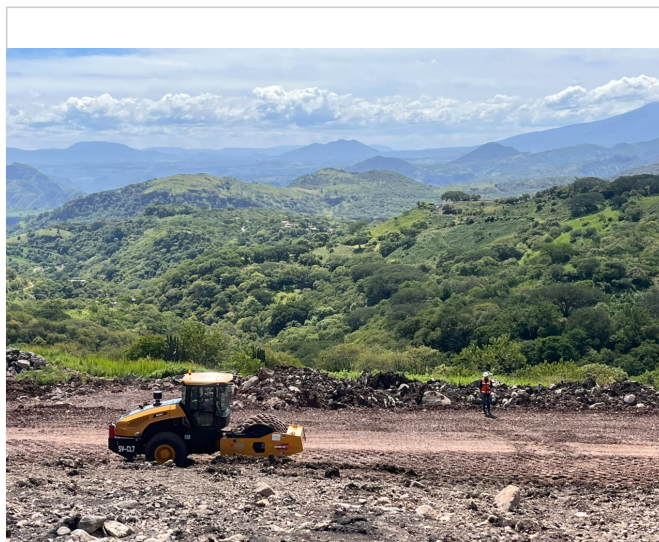

Densificación con vibrocompactador tipo pata de cabra



Control topográfico de la capa con equipo GNSS



Suministro y descarga de material para capa siguiente

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

CAPA 12 CONFORMADA Y LIBERADA POR PROCESO CONSTRUCTIVO · ESPESOR COMPACTADO VERIFICADO (0.50 M) · CONTINUIDAD A LA SIGUIENTE CAPA

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión
