

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Domingo 06 de Septiembre de 2026	REPORTE No.	02
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (Control de Calidad)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EMPRESA EJECUTORA	Virgo		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — corte y clasificación de material; secado, peso volumétrico y ensayos de laboratorio		

2. Personal de control de calidad

No.	Nombre	Puesto
1	José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
2	Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

En proceso

Corte y clasificación (Virgo)

Concluido

Secado de muestras

Realizado

Peso volumétrico seco suelto

En proceso

Ensayes de laboratorio

3. Descripción de actividades realizadas

Durante la jornada del 06 de septiembre de 2026, derivado de las condiciones climatológicas presentadas en el área de trabajo, las actividades de campo se limitaron al corte y clasificación de material, realizadas por la empresa ejecutora Virgo.

Por parte del área de control de calidad de EDD, se dio continuidad al secado de las muestras de material obtenidas previamente. Una vez concluido el secado, se procedió a la determinación del peso volumétrico seco suelto del material.

Asimismo, se dio inicio a los ensayos de granulometría de gravas, dejándose en proceso la saturación de roca para la obtención de su densidad y absorción. De manera adicional, se dejó preparado el material correspondiente para la realización de los límites de consistencia (Atterberg) y para la granulometría de finos.

Estado de los ensayos de laboratorio

Ensayo / Actividad	Estado
Secado de muestras	Concluido
Peso volumétrico seco suelto	Realizado
Granulometría de gravas	En proceso
Saturación de roca (densidad y absorción)	En proceso
Límites de consistencia (Atterberg)	Programado
Granulometría de finos	Programado

Los resultados de los ensayos en proceso y programados se documentarán en reportes de seguimiento una vez disponibles.

4. Registro fotográfico



Imagen 1 — Vista general de los trabajos de corte y clasificación de material bajo condiciones de niebla en el área.

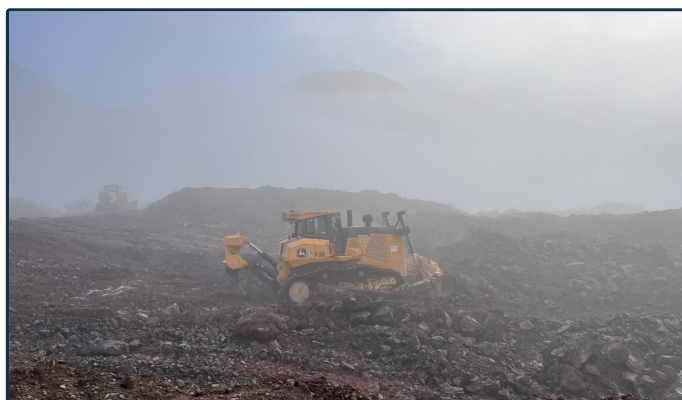


Imagen 2 — Tractor de la empresa ejecutora Virgo realizando el corte y clasificación de material.



Imagen 3 — Material clasificado, dispuesto para su cuarteo y muestreo en laboratorio.



Imagen 4 — Determinación del peso volumétrico seco suelto del material (recipiente MDPT-01-02).



Imagen 5 — Cuarteo de material para la preparación de muestras de laboratorio.



Imagen 6 — Ensayo de granulometría de gravas en laboratorio de control de calidad EDD.

5. Conclusiones y siguiente etapa

Debido a las condiciones climatológicas presentadas durante la jornada, las actividades de campo se limitaron al corte y clasificación de material por parte de la empresa ejecutora Virgo. En paralelo, el área de control de calidad de EDD concluyó el secado de las muestras y la determinación del peso volumétrico seco suelto, dando inicio a los ensayos de granulometría de gravas y a la saturación de roca para su densidad y absorción.

Como siguiente etapa, se dará continuidad a los ensayos de granulometría de gravas y de saturación de roca en proceso, y se procederá con los límites de consistencia (Atterberg) y la granulometría de finos con el material dejado preparado para tal fin.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

CORTE Y CLASIFICACIÓN EN PROCESO · SECADO Y PESO VOLUMÉTRICO CONCLUIDOS · ENSAYES DE
LABORATORIO EN PROCESO



EDD Ingenieria y Consultoria S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión
